


筑西広域市町村圏事務組合 環境センター 基幹的設備改良工事

工事状況（令和7年8月）

○燃焼設備（1号炉）

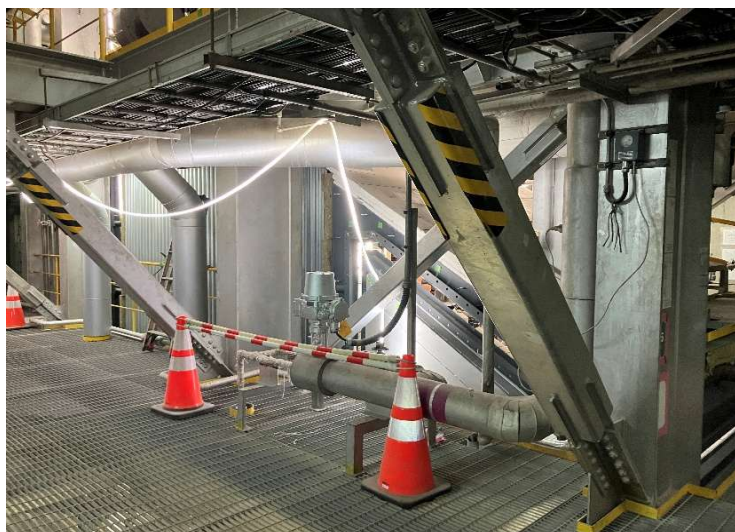

焼却炉ケーシング据付後



耐火物工事施工中

○燃焼ガス冷却設備（1号炉）



ボイラ据付後



煙道及び節炭器据付後

○燃焼ガス冷却設備（1号炉）



ボイラ給水ポンプ据付後

◆令和7年5月～令和7年8月

5月からボイラ節炭器、ボイラ給水ポンプの据付を行いました。7月から燃焼設備焼却炉ケーシング、耐火物工事、保温工事、計装工事を行っています。

◆令和7年9月～

9月からも継続して耐火物工事、保温工事、計装工事を10月まで行う予定です。10月21日より乾燥焚き及び温水洗浄を行います。

11月より試運転、性能試験を行い、2月末には工事完成予定です。
