


筑西広域市町村圏事務組合 環境センター 基幹的設備改良工事
工事状況（令和4年9月）

○燃焼ガス冷却設備（3号炉）



ボイラ（1パス）据え付け

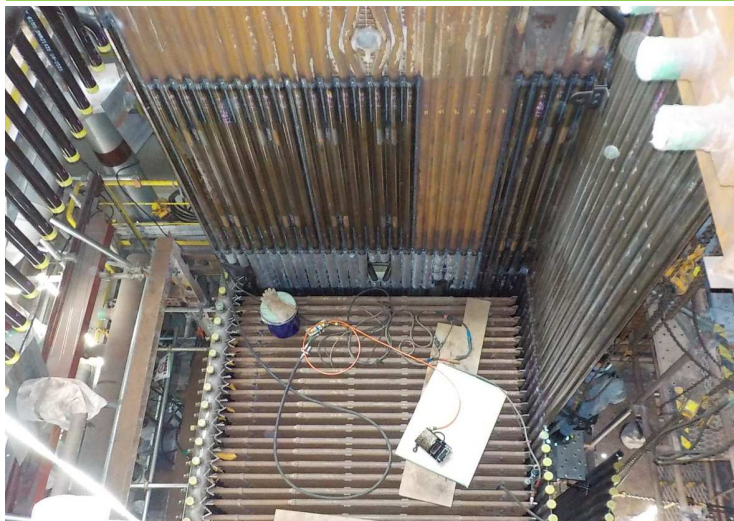

ボイラ（3パス）据え付け

○燃焼設備（3号炉）



押し込み送風機据え付け



誘引通風機電動機据付け



◆令和4年8月～9月

ボイラの据付け、燃焼装置の据付けを実施しました。

10月からはボイラの据付け引き続きを実施します。

11月からは25日間の共通設備の整備を実施する予定です。

◆共通設備工事内容

ダスト搬出コンベヤ更新、定量切り出し装置更新、飛灰処理装置
コンベヤ更新、飛灰処理架台更新、局所集じんダクト更新、機器
冷却水冷却塔更新、計装用空気圧縮機更新、雑用空気圧縮機更新、
タービンバイパス装置更新、アクティブフィルタ更新、受変電設
備一部改修、直流電源装置更新、交流電源装置更新、無停電電源
